


Anlage 1: Übersicht der städtischen Maßnahmen und der Maßnahmen anderer Baulastträger

Nr.	Maßnahme	Baulast-träger	Art d. Maßnahme	Angaben zur Bauzeit	Baustellenverkehr
1	2-gleisiger Ausbau Brackeler-/Asselner Hellweg von Geleitstraße bis Asselner Straße	Städtische Maßnahme	Gleis-, Straßen- u. Kanalbau	Bauzeit 2 Jahre Anfang 2019 - Mitte 2021	Fahrtrichtung stadteinwärts bleibt erhalten, Umleitung für die Gegenrichtung über die Holzwickeder Straße u. Aplerbecker Straße
2	Umbau Buddenacker	DEGES	Verlegen von Versorgungsleitungen	ab 2018 - 2021	Keine Beeinträchtigung des Straßennetzes in Hörde und Aplerbeck
3	Verlegung Radweg B 1 in den Hauptfriedhof	DEGES	Straßenbauarbeiten	noch nicht bekannt	Keine Umleitung erforderlich
4	Sperrung der Abfahrt der B 1 zur Leni-Rommel-Straße	DEGES	Straßenbauarbeiten u. Arbeiten am Versorgungsnetz	noch nicht bekannt	Umleitung über die Abfahrt Am Gottesacker oder Buddenacker. Die Sperrung der B1 Abfahrt nicht zeitgleich mit der Vollsperrung Buddenacker (Nr. 11)
5	Brückenbauwerk Leni-Rommel-Straße/B 1	DEGES	Brückenverbreiterung u. Arbeiten am Versorgungsnetz	noch nicht bekannt	Maßnahme nicht zeitgleich mit Brücke Aplerbecker Straße (Nr. 6) durchführen. Umleitung über die Abfahrt Am Gottesacker oder Buddenacker. Von den Zufahrtsmöglichkeiten nach Aplerbeck über die Marsbruchstraße, Leni-Rommel-Straße und Buddenacker darf immer nur eine Ab-/Auffahrt gesperrt werden
6	Brückenbauwerk Aplerbecker Straße/B 1	DEGES	Brücken- u. Arbeiten am Versorgungsnetz	noch nicht bekannt	Umleitung der Aplerbecker Straße nicht erforderlich, da die Verkehre im vorhandenen Straßenraum geführt werden können
7	Umbau Einmündung Aplerbecker Straße/Leni-Rommel-Straße	Städtische Maßnahme	Straßen- u. Kanalbau, Arbeiten an Versorgungsleitungen	Bauzeit 0,75 Jahre März 2019 - Nov. 2019	Keine Umleitung erforderlich, alle Fahrtrichtungen offen. Keine zeitgleiche Sperrung einer Fahrtrichtung o. Vollsperrung in unmittelbarer Umgebung. Zeitgleiche halbseitige Sperrung auf das nötigste Maß beschränken.
8	Brückenbauwerk Schleefstraße/B 1	DEGES	Brücken- u. Arbeiten am Versorgungsnetz	noch nicht bekannt	Keine Umleitung erforderlich.
9	Brückenbauwerk B1/Emschertalstraße	DEGES	Brückenverbreiterung	noch nicht bekannt	Einzelheiten der notwendigen Sperrungen noch nicht bekannt.
10	Unterführung Emschertalstraße/B 1	DEGES	Arbeiten am Versorgungsnetz	noch nicht bekannt	Umleitung des Verkehrs ist nicht notwendig, da die notwendige Restbreite verbleibt, um eine Vollsperrung zu umgehen.
11	Brückenbauwerk Buddenacker/B 1	DEGES	Brückenverbreiterung u. Arbeiten am Versorgungsnetz	noch nicht bekannt	Keine Umleitung erforderlich. Die Vollsperrung Buddenacker möglichst zeitgleich nicht mit Aplerbecker Straße/Leni-Rommel-Straße (Nr. 7), der Brücke Emschertalstraße (Nr. 9), Brücke Aplerbecker Straße (Nr. 6), und der Brücke Leni-Rommel-Straße (Nr. 5 und 6)

					Die Vollsperrung Buddenacker (alle Auf-/Abfahrten auf die B 1 bleiben erreichbar, Dauer ca. 30 Arbeitstage, zusätzlich ist geplant, an drei weiteren Wochenenden von Sa 20:00 Uhr bis Mo 5:00 Uhr nur die Auf-/Abfahrten auf die B1 zu sperren) ist nur kompatibel mit der Brücke Schleefstraße (Nr. 8), dem 2-gleisigen Ausbau Brackeler-/Asselner Hellweg (Nr. 1) und der Sperrung der Schüruferstraße (Nr. 12).
12	Schüruferstr. von westlich Kneebuschstr. bis Schürener Str.	Städtische Maßnahme	Straßen- u. Kanalbau	Bauzeit 1 Jahr Okt. 2018 - Sept. 2019	Einspurige Verkehrsführung mit Signalanlage, keine Umleitung.
	Schüruferstraße von Nagelpöthen bis westlich Ringofenstraße	Städtische Maßnahme	Straßen- u. Kanalbau		Vollsperrung, Umleitung über die Aplerbecker Str., Westfalendamm B1, B 236, Abfahrt Schüruferstraße
13	Umbau Brückenbauwerk Vellinghauser Straße/DB	DB	Straßen- u. Brückenbauarbeiten	noch nicht bekannt	Umleitung erfolgt über die Schlagbaumstraße, Kortenstraße, Schwerter Straße und Stallbaumstraße. Die Maßnahme nicht zeitgleich mit der Baumaßnahme Brücke Lichtendorfer Straße (Nr. 15; eine Sperrung wurde bereits vom 29.06.18 bis 01.07.2018 durchgeführt)
14	Ausbau der B 236 auf 4 Fahrspuren ab südlich Tunnel Berghofen bis Talstraße in Schwerte	DEGES	Straßenbauarbeiten	noch nicht bekannt	Umleitungs- bzw. Verdrängungsverkehr im Hörder und Aplerbecker Straßennetz sind möglich.
15	Umbau der Brücke Lichtendorfer Straße /A 1	DEGES	Brückenarbeiten u. Arbeiten am Versorgungsnetz	noch nicht bekannt	Aus heutiger Sicht ist keine Umleitung erforderlich, aber abhängig von Maßnahme Nr. 13.
16	Brücke Am Remberg	Städtische Maßnahme	Brückenneubau u. Straßenbau	Bauzeit 9 Monate Herbst 2019 - Mitte 2020	Beginn vor 2. BA Kohlensiepen-/Meinbergstr. mit einspuriger Verkehrsführung, kurzzeitige Vollsperrung möglich. Nicht zeitgleich mit Schüruferstr. Umleitung über Kohlensiepen-/Meinbergstr. u. Schürenerstr.
17	Fußstraße von Herrmannstraße bis Am Remberg	Städtische Maßnahme	Straßen- u. Kanalbau	Bauzeit 2 Jahre Anfang 2019 - Anfang 2020	Baustellenverkehre einspurig jedoch in beide Richtungen in die Fußstr., keine Umleitung für eine Richtung, verkehrliche Beeinträchtigung auf ein Minimum reduziert
18	Östliche Hermannstraße von Hörder-Bach-Allee bis ca. 50 m westlich Kreisverkehr Berghofer Straße	Städtische Maßnahme	Straßen- u. Kanalbau	Bauzeit 1 Jahr Ende 2018 - Ende 2019	Bau erfolgt abschnittsweise, eine Fahrtrichtung von Ost nach West bleibt frei, eine Umleitung erfolgt über die Benninghofer Straße, An der Goymark. Die Baumaßnahmen östliche Hermannstraße (Nr. 18) und Fußstraße (Nr. 19) beeinflussen die Baumaßnahmen in Aplerbeck nur unwesentlich, so dass Abhängigkeiten vernachlässigt werden

					<p>können. Das zum Teil zeitgleiche Bauen bei den Baumaßnahmen Fußstraße (Nr. 17) und der östlichen Hermannstraße (Nr. 18) ist aus folgenden Gründen notwendig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Um die Förderung nach KInvFG (90 % Förderung) für Maßnahmen in der östlichen Hermannstraße zu erhalten, müssen die Maßnahmen bis Ende 2019 abgeschlossen sein. <p>Damit ist eine zeitliche Verschiebung nicht möglich. Die Fahrbahnen werden im Vollausbau komplett erneuert, die Bushaltestellen und Querungshilfen werden barrierefrei erstellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Einbau des lärmoptimierten Asphalts kann nur in der warmen Jahreszeit erfolgen. <p>Daher ergibt sich ein Baufenster für die östliche Hermannstraße (Nr. 18) von etwa Ende 2018 bis zum Herbst 2019.</p>
19	Kohlensiepenstraße/Meinbergstraße 2. BA. von An den Emscherauen bis rd. 150 m südlich der ehemaligen Bahnbrücke	Städtische Maßnahme	Straßenbau	Bauzeit 8 Monate Mitte 2020 - Mitte 2021	Vollsperrung; Umleitung läuft über Am Remberg, Schürener Straße, Meinbergstraße. Beginn abhängig von der anliegenden privaten Bebauung
20	Marsbruchstraße Höhe Hs. Nr. 147 bis 173	Städtische Maßnahme	Kanalbau u. Arbeiten an Versorgungsleitungen	noch nicht bekannt	Nicht zeitgleich während der Sperrung der Schürufersstraße, Abfahrt B1/A44 und der Abfahrt B1/Buddenacker
21	Benninghofer Straße von DB-Brücke bis Am Oelpfad	Städtische Maßnahme	Straßen- u. Kanalbau	noch nicht bekannt	Aus heutiger Sicht ist keine Umleitung erforderlich, aber abhängig von Maßnahme 13.
22	Brücke Hörder Brückenplatz	Städtische Maßnahme	Brückensanierung	Bauzeit 0,5 Jahre August 2018 - März 2019	Keine Umleitung erforderlich, Sanierung mit straßenverkehrlichen Einschränkungen unter Beibehaltung der vorhandenen Fahrspuren
23	Höchstener Straße 1-67	DONETZ	Auswechslung der Wasserleitung	Anfang 2019	Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs in der Höchstener Straße durch Signalsteuerung. Abhängigkeit mit Umleitungs- bzw. Verdrängungsverkehr durch Maßnahme B 236 (Nr. 14).

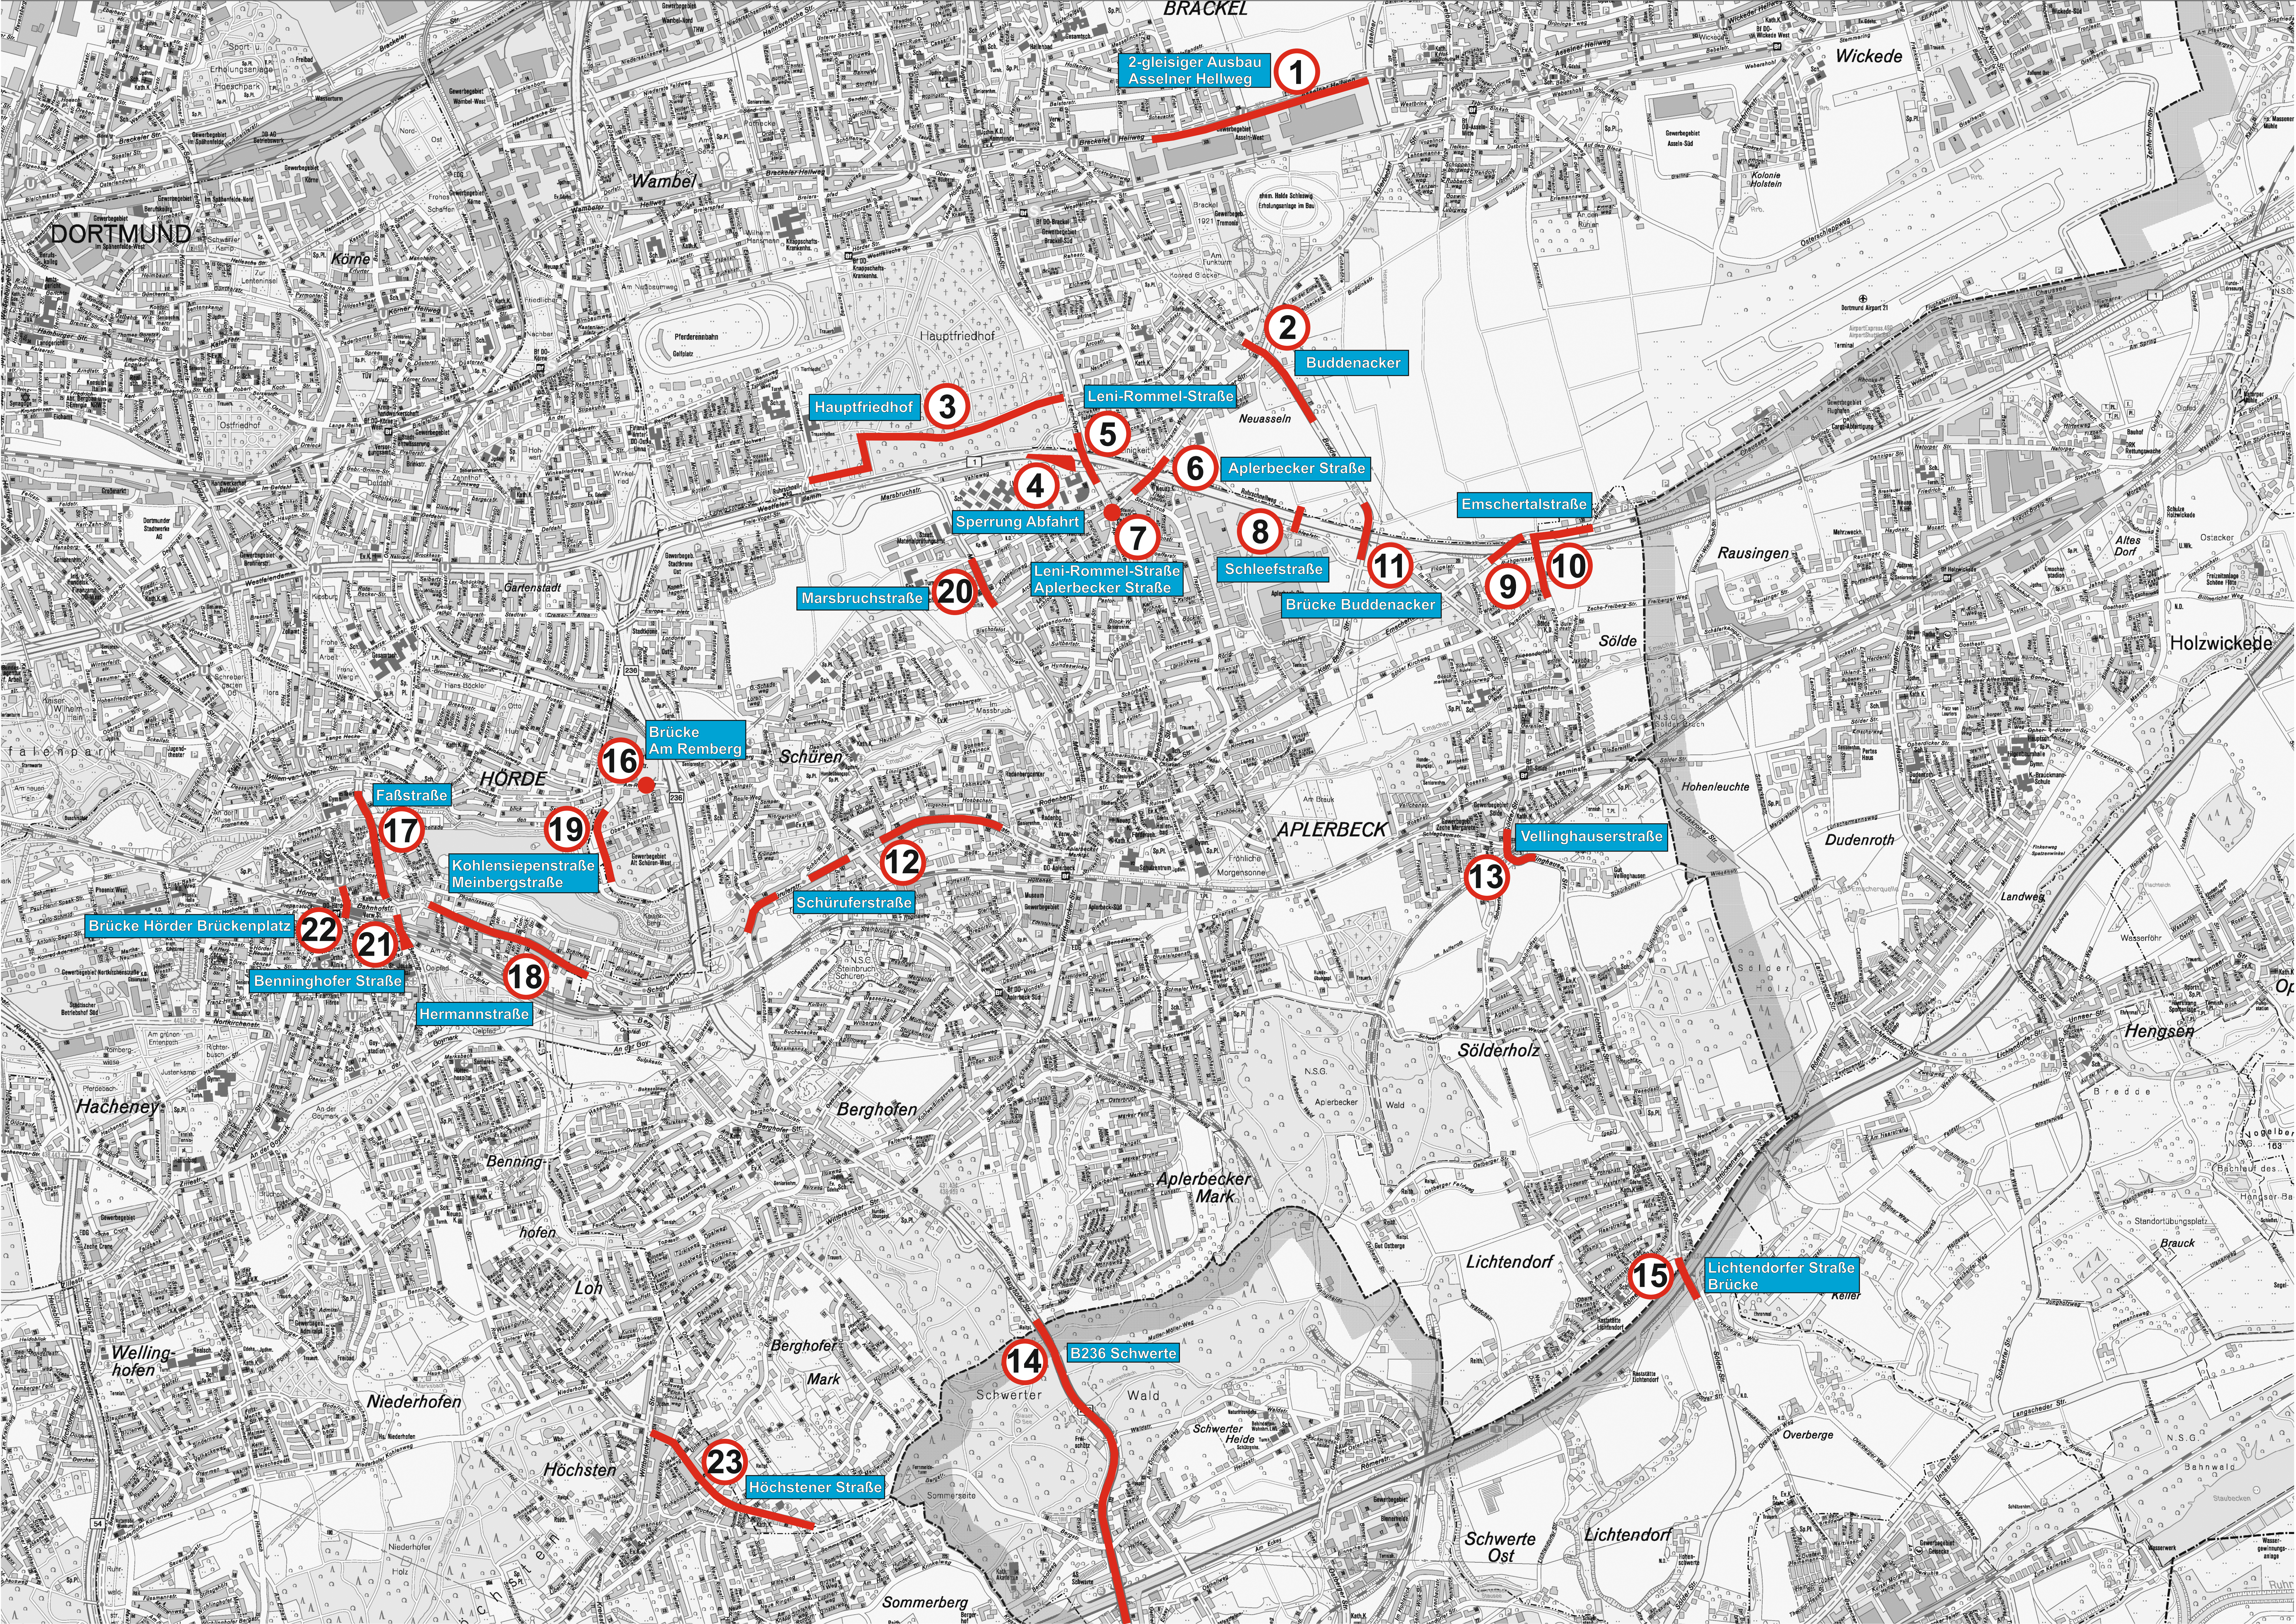

2-gleisiger Ausbau
Assener Heilweg 1

1

2

Buddenacker

3

Hauptfriedhof

5

Leni-Rommel-Straße

6

Aplerbecker Straße

4

Sperrung Abfahrt

7

Leni-Rommel-Straße
Aplerbecker Straße

8

Schleefstraße

11

Brücke Buddenacker

9

Emschertalstraße

10

9

16

Brücke
Am Remberg

17

Faßstraße

19

Kohlensiepenstraße
Meinbergstraße

12

Schürferstraße

13

Vellinghauserstraße

22

Brücke Hörter Brückenplatz

21

Benninghofer Straße

18

Hermannstraße

14

B236 Schwerte

15

Lichtendorfer Straße
Brücke

23

Höchstener Straße

DORTMUND

Wambel

BRACKEL

Wickede

Körne

Gartenstadt

Schüren

APLERBECK

HÖRDE

Berghöfen

Aplerbecker
Mark

Sölderholz

Dudenroth

Hachenev

Benning-
hofen

Berghofer
Mark

Schwerte
Wald

Lichtendorf

Overberge

Welling-
hofen

Niederhofen

Höchsten

Sommerberg

Schwerte
Ost

Lichtendorf

Hengsen

Bruck

Langgeder Str.

Stavbecker
